

INFO VERGADERING KEIEMDORPSTRAAT 2017-08-28



INLEIDING

- Voorwoord
- Historiek
- Werken nutsleidingen
- Riolering
- Bovenbouw
- Planning en Fasering van de werken
- Minder hinder

Voorwoord – Schepenen Bieke Moerman



Historiek

- Participatievergadering en infomoment voor de bewoners.
 - 10 maart 2015 -> infomoment toelichting riolering + participatie
 - 1 juli 2015 -> info wegeniswerken
- Overleg met de Provincie West-Vlaanderen -> aanpassingen na laatste voorstelling aan Tramstatieplein
- Overleg met de nutsleidingen

Werken nutsleidingen

- Beperkt tot
 - vernieuwing armaturen
 - Vernieuwing openbare verlichting in kernzone (kerk – tramstatie)
 - Kerstverlichting in de kernzone
- Ingepland voor de wegenis en rioleringswerken -> beperkte hinder (voetpad – parkeerzone)





Aardgas- of elektriciteitsaansluiting
verzwaren of wijzigen?

**Doe vandaag nog uw aanvraag via de Infrax
website:**

www.infrax.be

[Home](#)
[Contact](#)
[Jobs](#)
[Pers](#)

[Vlaams Gewest](#)
[Région wallonne](#)


 netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering




[Zoeken](#)

[Meterstanden](#)
[Aansluitingen](#)
[Groene stroom](#)
[Mijn premies](#)
[Over Infrax](#)
[Mijn Infrax](#)

[→ Meterstand](#)

Premies

Bouwteams

Energiescan


[Meterstand doorgeven →](#)

METERSTANDEN



**METERSTAND
DOORGEVEN**


[→ Afspraak meteropname veranderen](#)

AANSLUITINGEN

Wil je een nieuwe aansluiting elektriciteit, aardgas, riolering of teledistributie? Of wil je iets aan je aansluiting wijzigen? Doe dan een aanvraag bij Infrax.

Alles over aansluitingen →

MIJN PREMIES

Krijg een premie voor je investering of neem deel aan een workshop voor energiebesparing!

- Vind je premie
- Workshop energiezuinig (ver)bouwen
- Bespaar energie
- Verminder je verbruik

Alles over premies en acties →

Via onze klantenkantoren:

Torhout: Noordlaan 9, 8820 Torhout

maandag	09:00 tot 16:00
dinsdag	09:00 tot 16:00
woensdag	09:00 tot 16:00
donderdag	09:00 tot 16:00
vrijdag	09:00 tot 16:00

Middelkerke: Klein Kasteelstraat 5, 8430 Middelkerke

maandag	09:00 tot 12:00	13:00 tot 16:00
dinsdag	gesloten	13:00 tot 16:00
woensdag	gesloten	gesloten
donderdag	09:00 tot 12:00	13:00 tot 16:00
vrijdag	gesloten	gesloten

Of via onze infolijn: 078 35 30 20

Nieuw rioleringsstelsel – waarom?

- Bestaande riolering in slechte staat
 - infiltratie van grondwater
- Verbetering werking zuiveringsstation
 - minder verdunning
- Europese Kaderrichtlijn water → tegen 2021 goede waterkwaliteit waterlopen
 - Overstorten verminderen
 - Waterkwaliteit verbeteren
 - Wateroverlast vermijden
- Ook afkoppeling op perceelsniveau



Nieuw rioleringsstelsel - aansluitingen

- Twee riolen

→ Twee huisaansluitputjes per woning
→ afkoppelingsdeskundige



Nieuw rioleringsstelsel - aansluitingen

- Afkoppelingsdeskundige
 - Contact: Via Infrac -> Bureau Deloof 0478 38 33 24 of michael.deloof@gmail.com
 - Heeft iedereen laatste plan, ondertekend exemplaar reeds teruggestuurd?
 - Uitvoering ten laatste 2 maanden nadat de huisaansluitputjes geplaatst werden.
 - Geen kelderaansluitingen

Wegeniswerken: Keiendorpstraat – Oude Keiemweg - Streuvelstraat


- Verschillende deelzone's:
 - o Buiten de bebouwde kom
 - o Binnen de bebouwde kom
 - o Zijstraten
 - o Centrumzone kerk
 - o Centrumzone 'oude tramstatie'
 - o Schoolomgeving



Wegenis: Keiendorpstraat - BuBeKo



Wegenis: Keiendorpstraat - BuBeKo

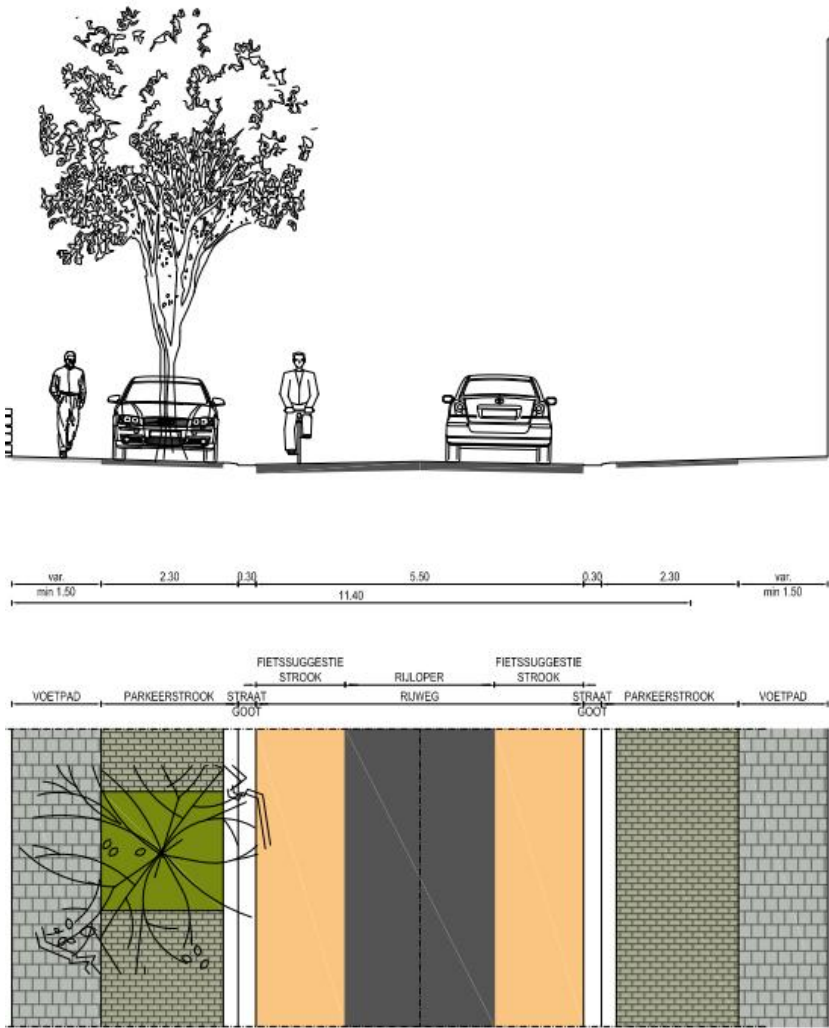




SWECO



Wegenis: Keiendorpstraat - BuBeKo



Wegenis: Keiendorpstraat - BiBeKo

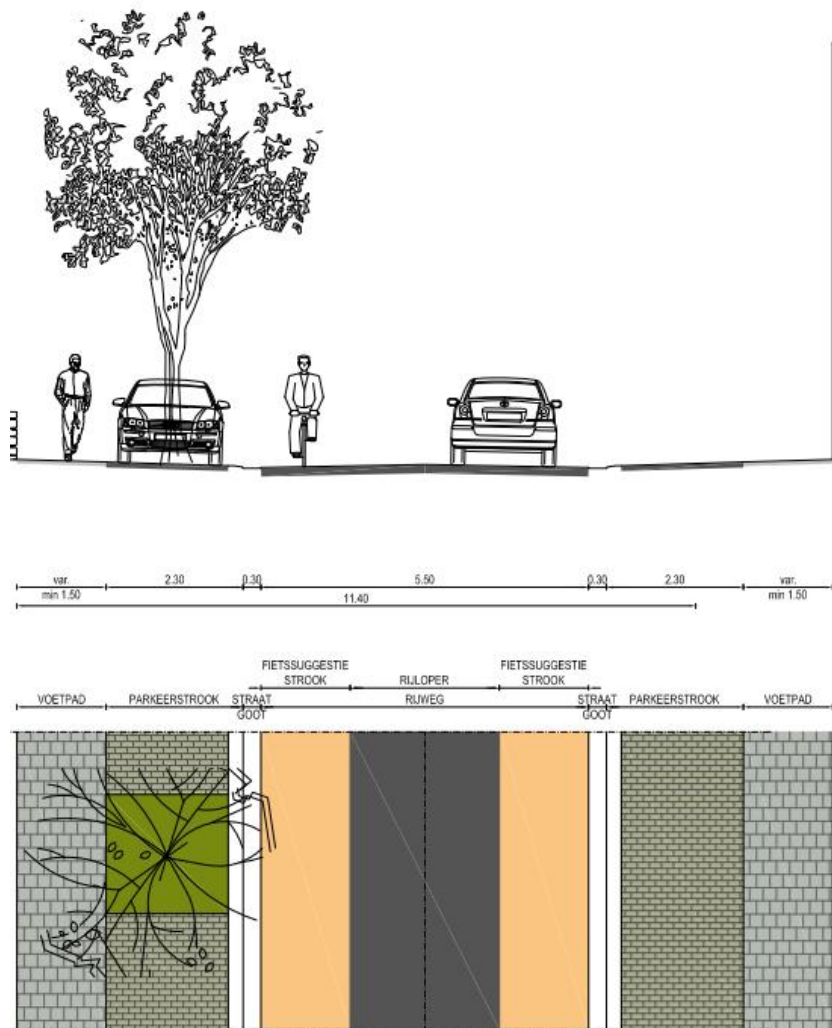


Wegenis: Keiendorpstraat - BiBeKo



SWECO



Wegenis: Keiendorpstraat – BiBeKo – tss tramstatie en Oude Keiemweg

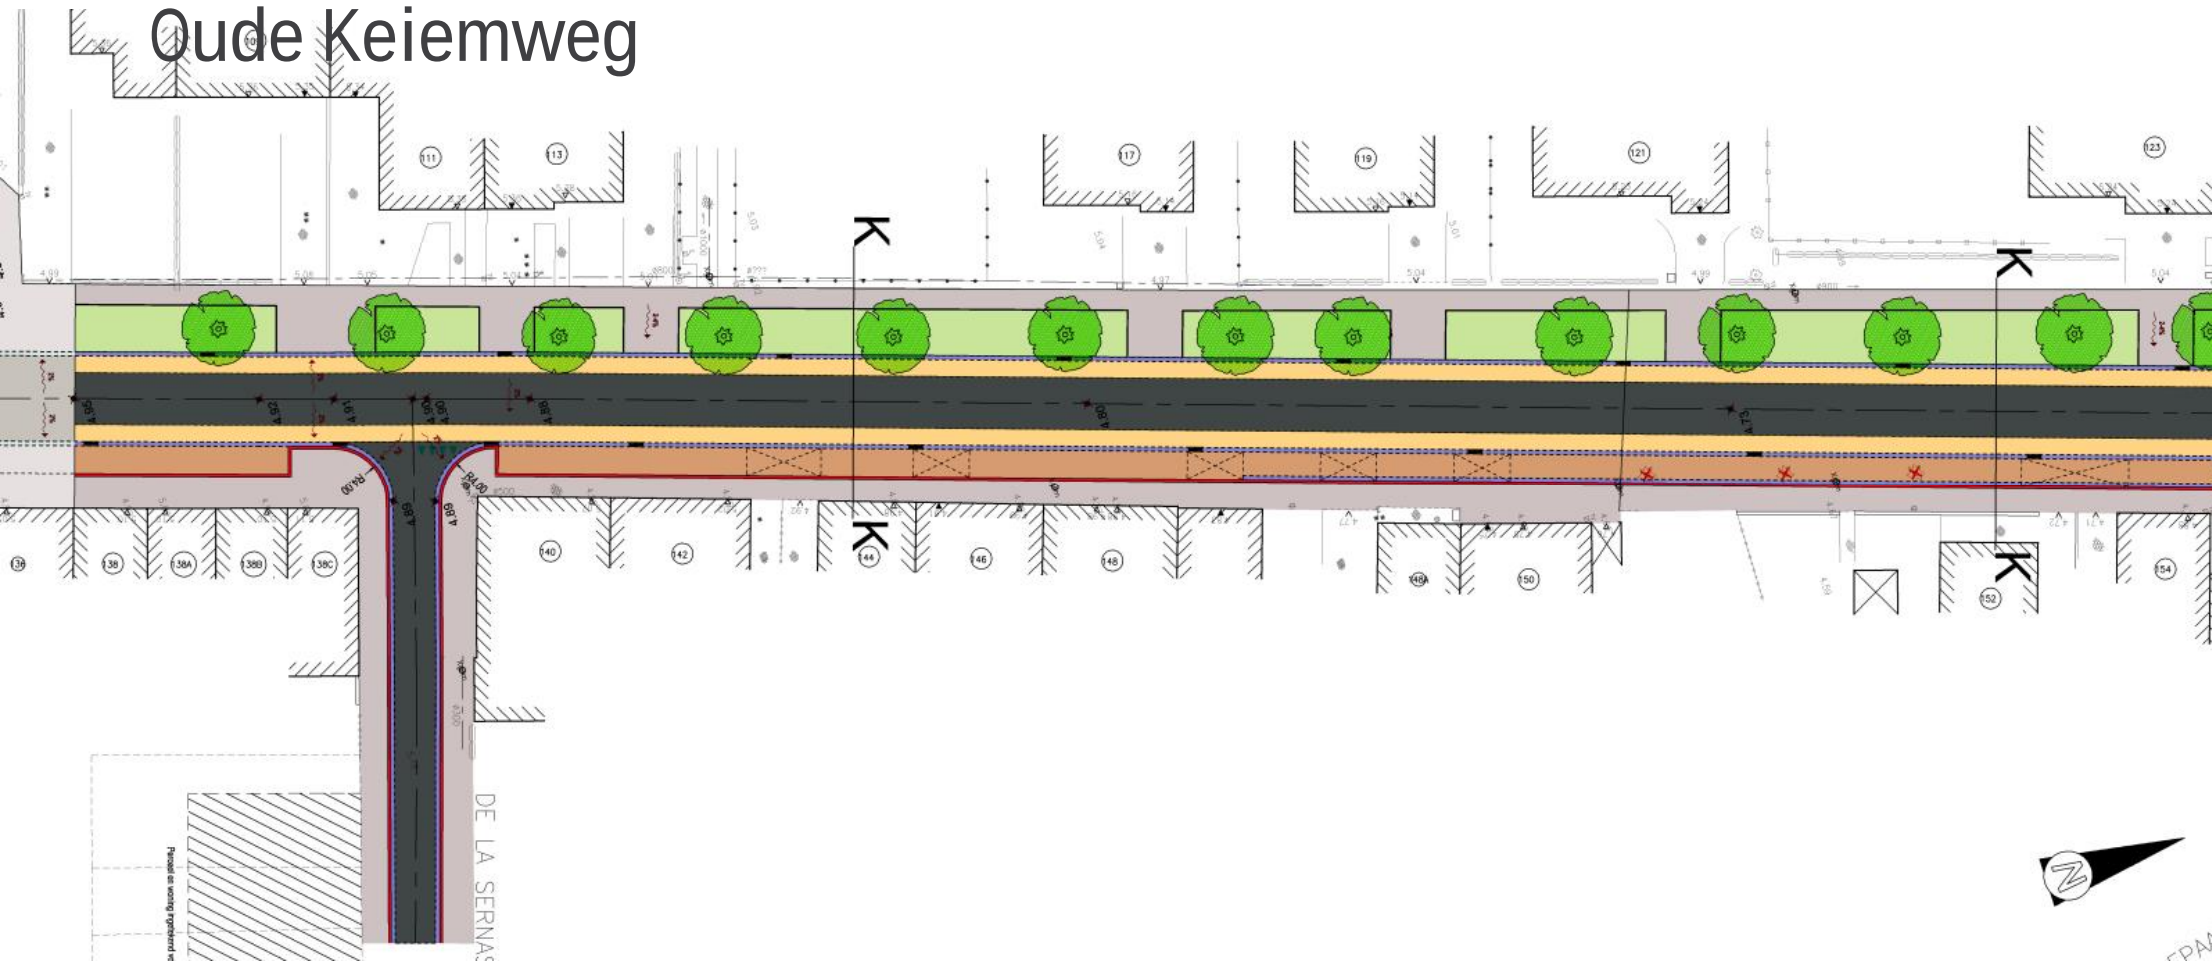


Wegenis: Keiendorpstraat – BiBeKo – tss tramstatie en Oude Keiemweg

Materiaalgebruik:

- Voetpaden : grijze betonstraatstenen 20/20/10
- Parkeerstroken : herbruikkeien 20/14
- Rijweg : asfalt met okerkleurige fietssuggestiestroken




Wegenis: Zijstraten - Streuvelstraat

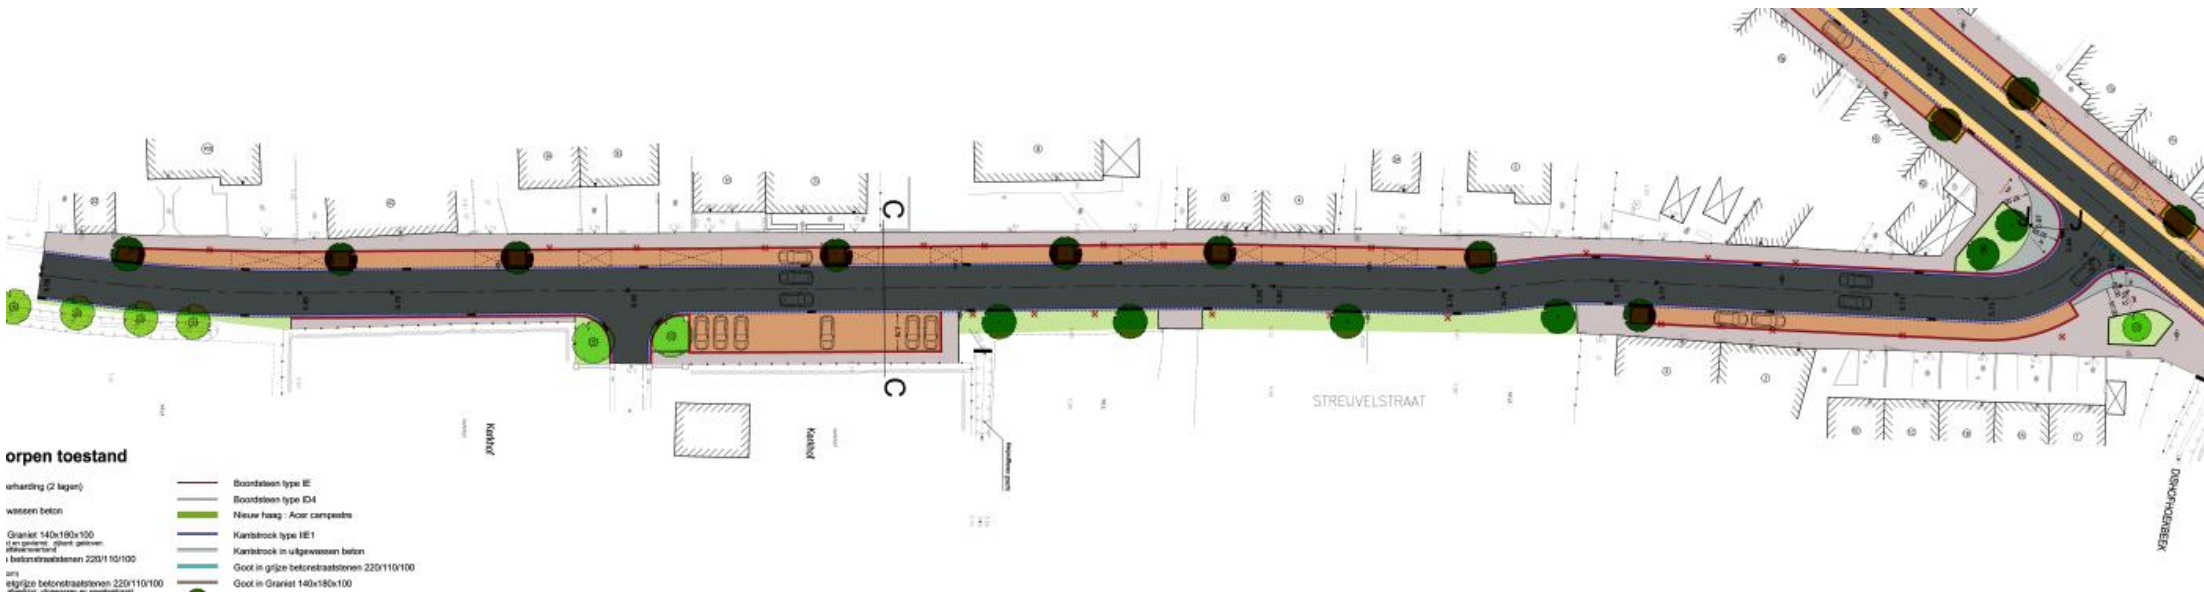


Wegenis: Zijstraten - Oude Keiemweg



Wegenis: Keiendorpstraat – Centrumzone - kerk

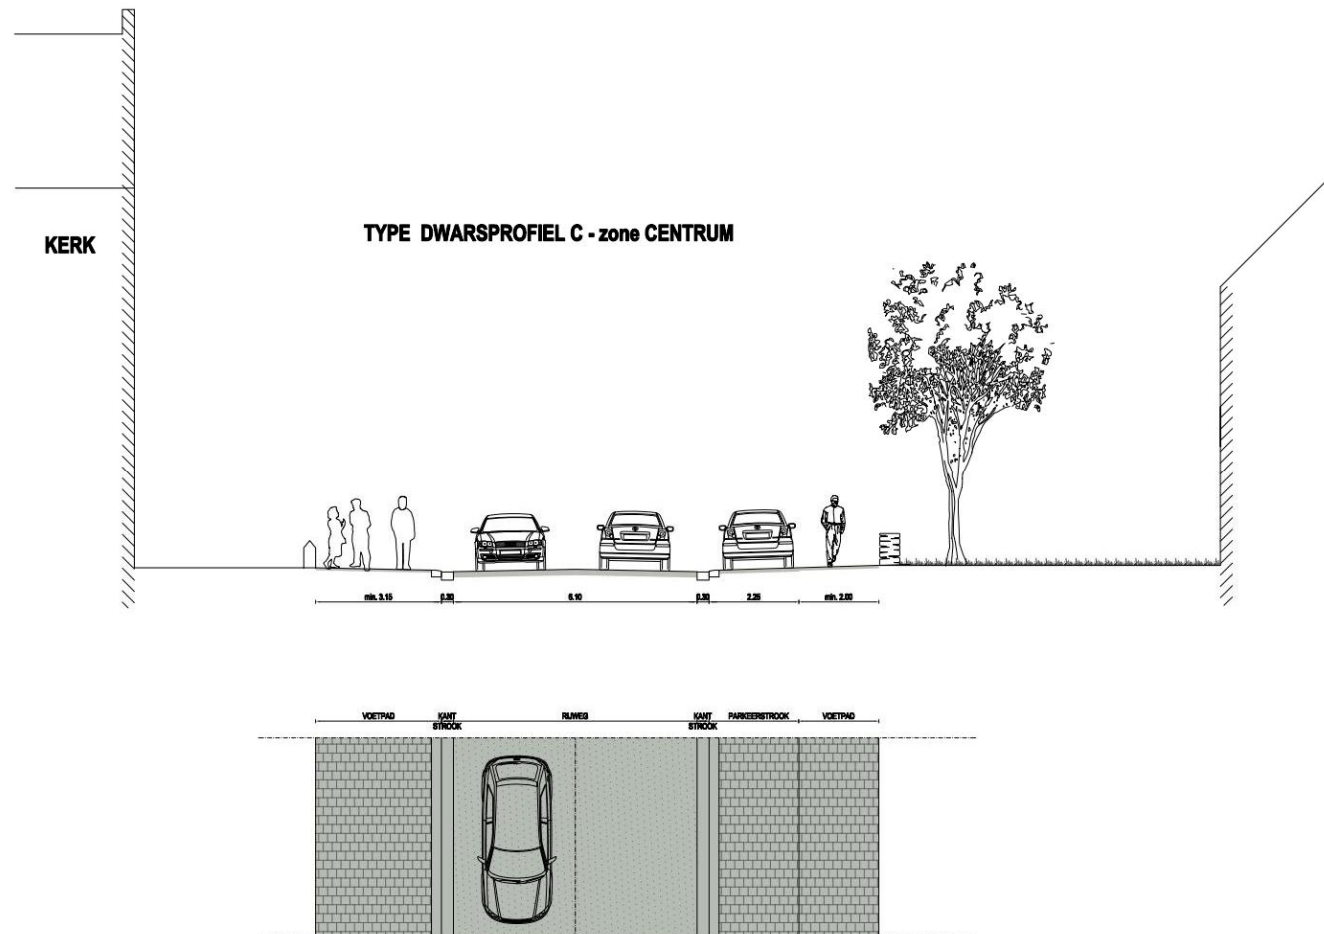

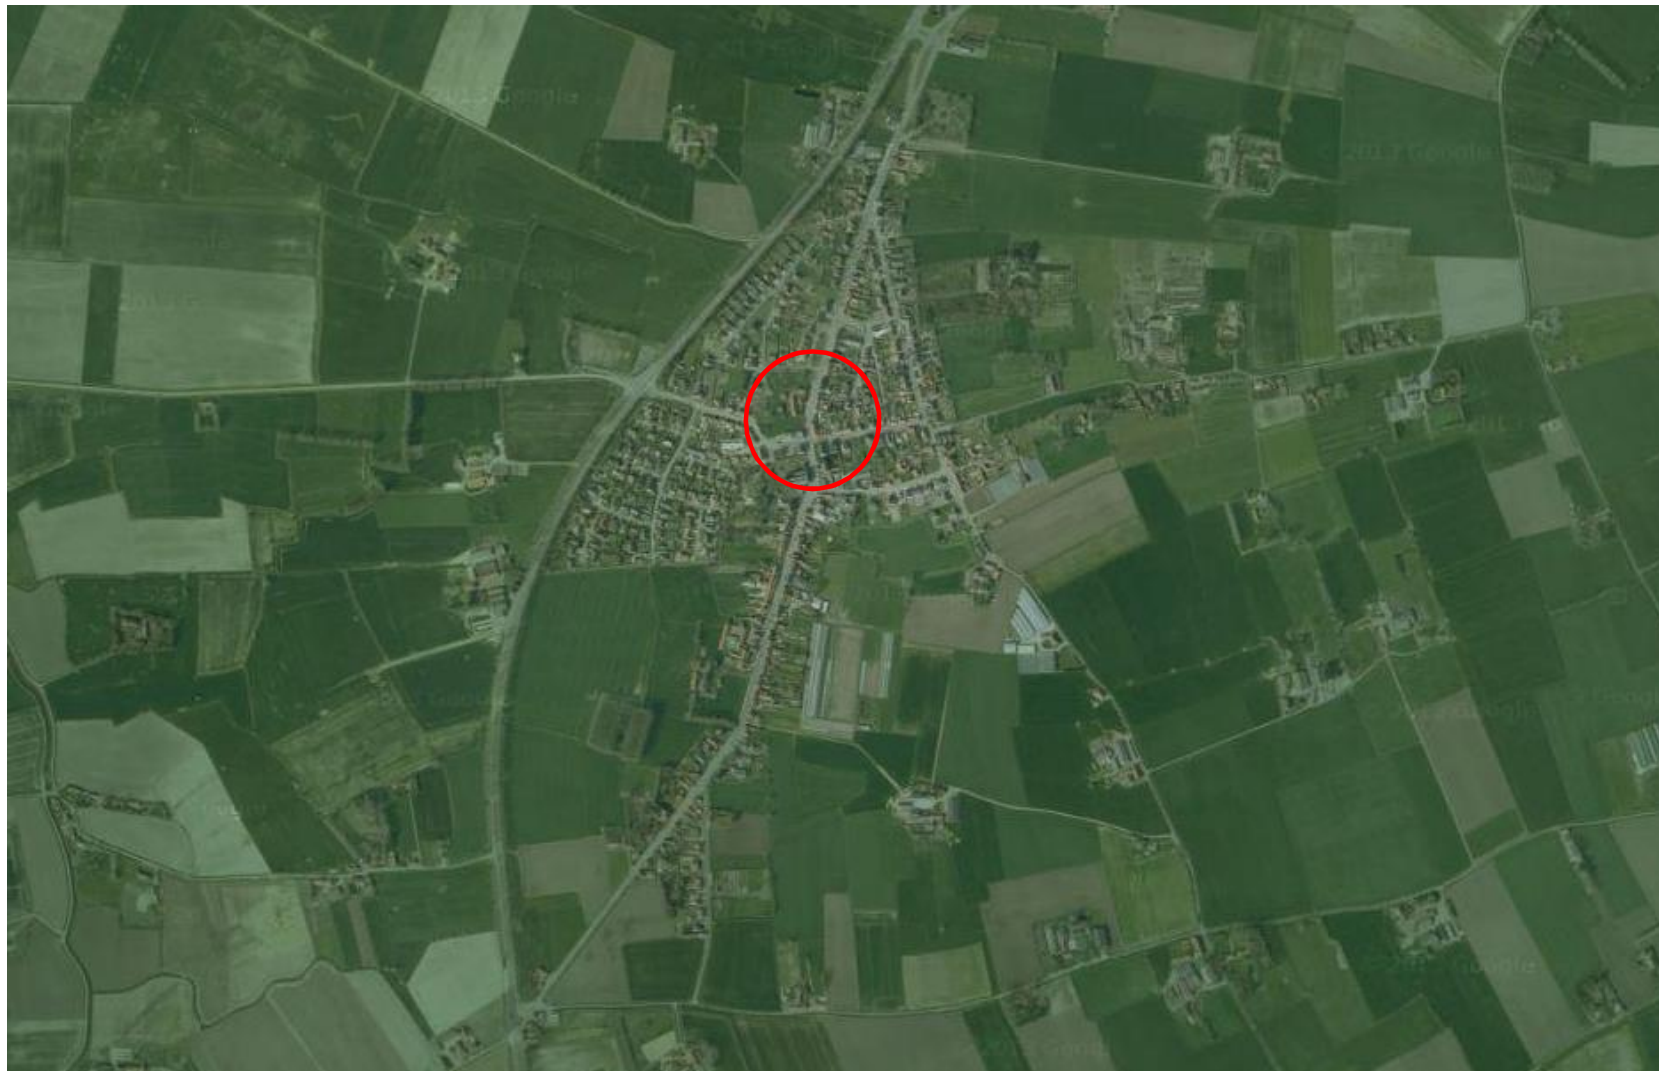




Voetpad: graniet




Rijloper: uitgewassen beton

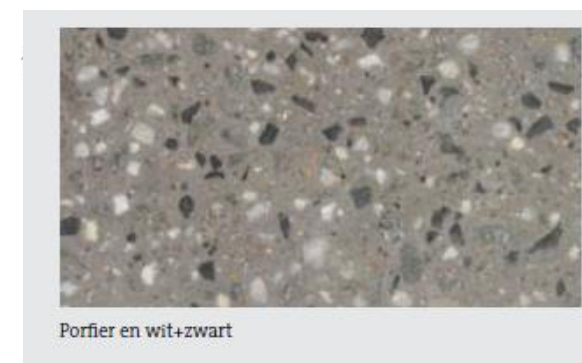




Wegenis: Keiendorpstraat – Schoolomgeving

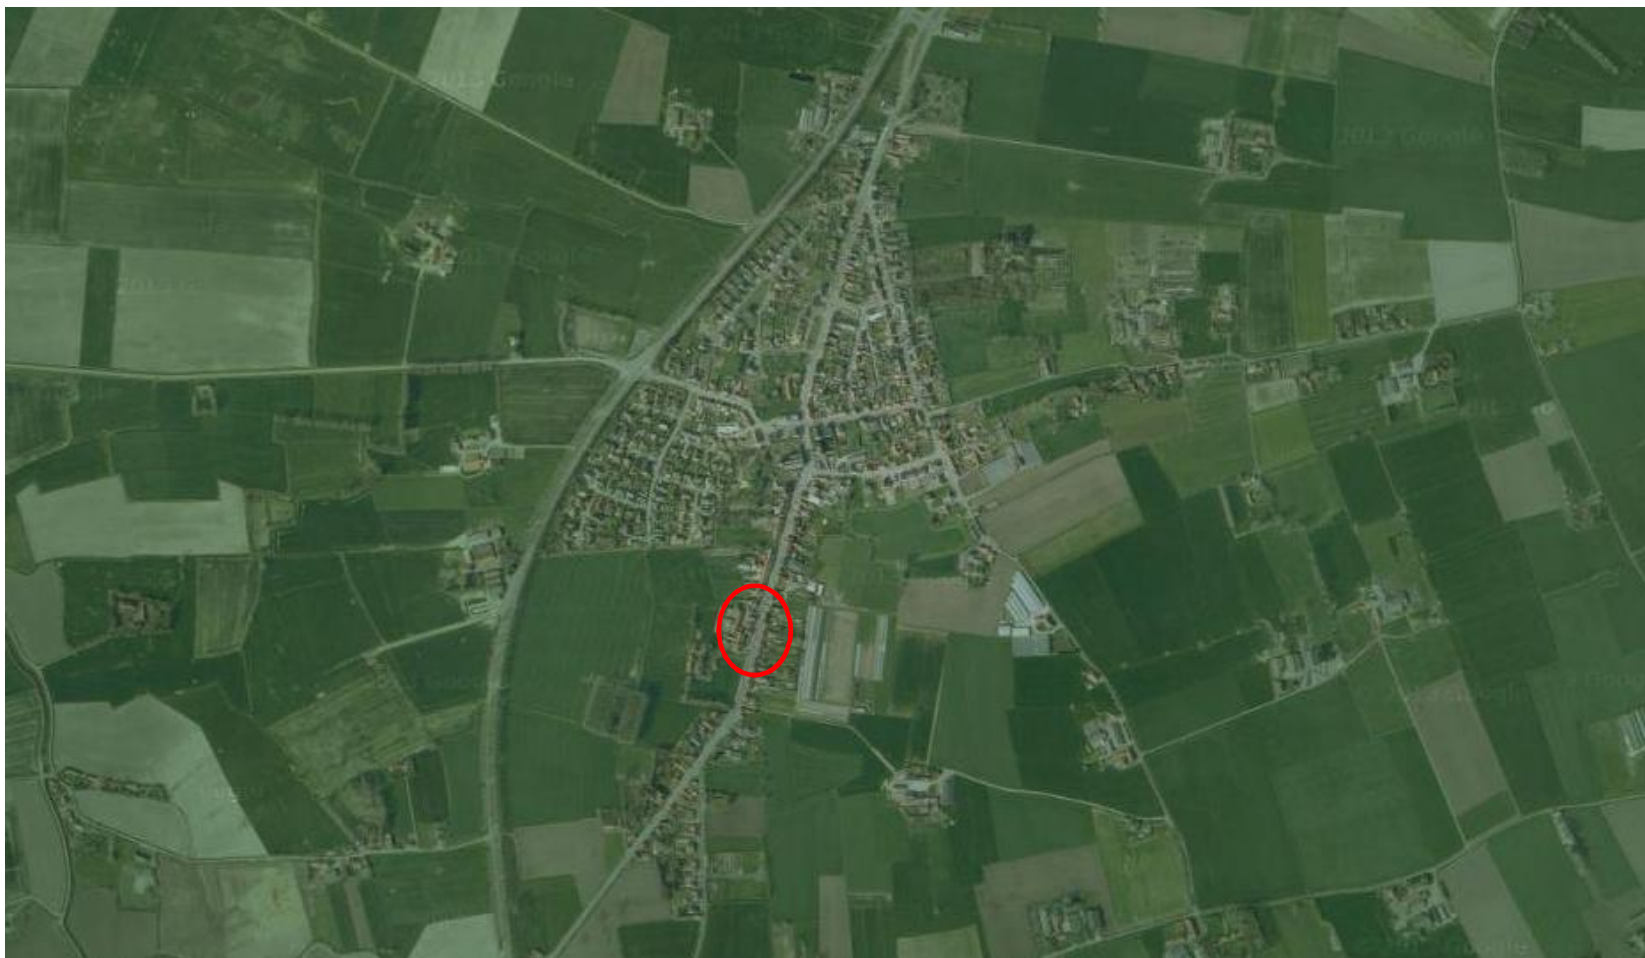



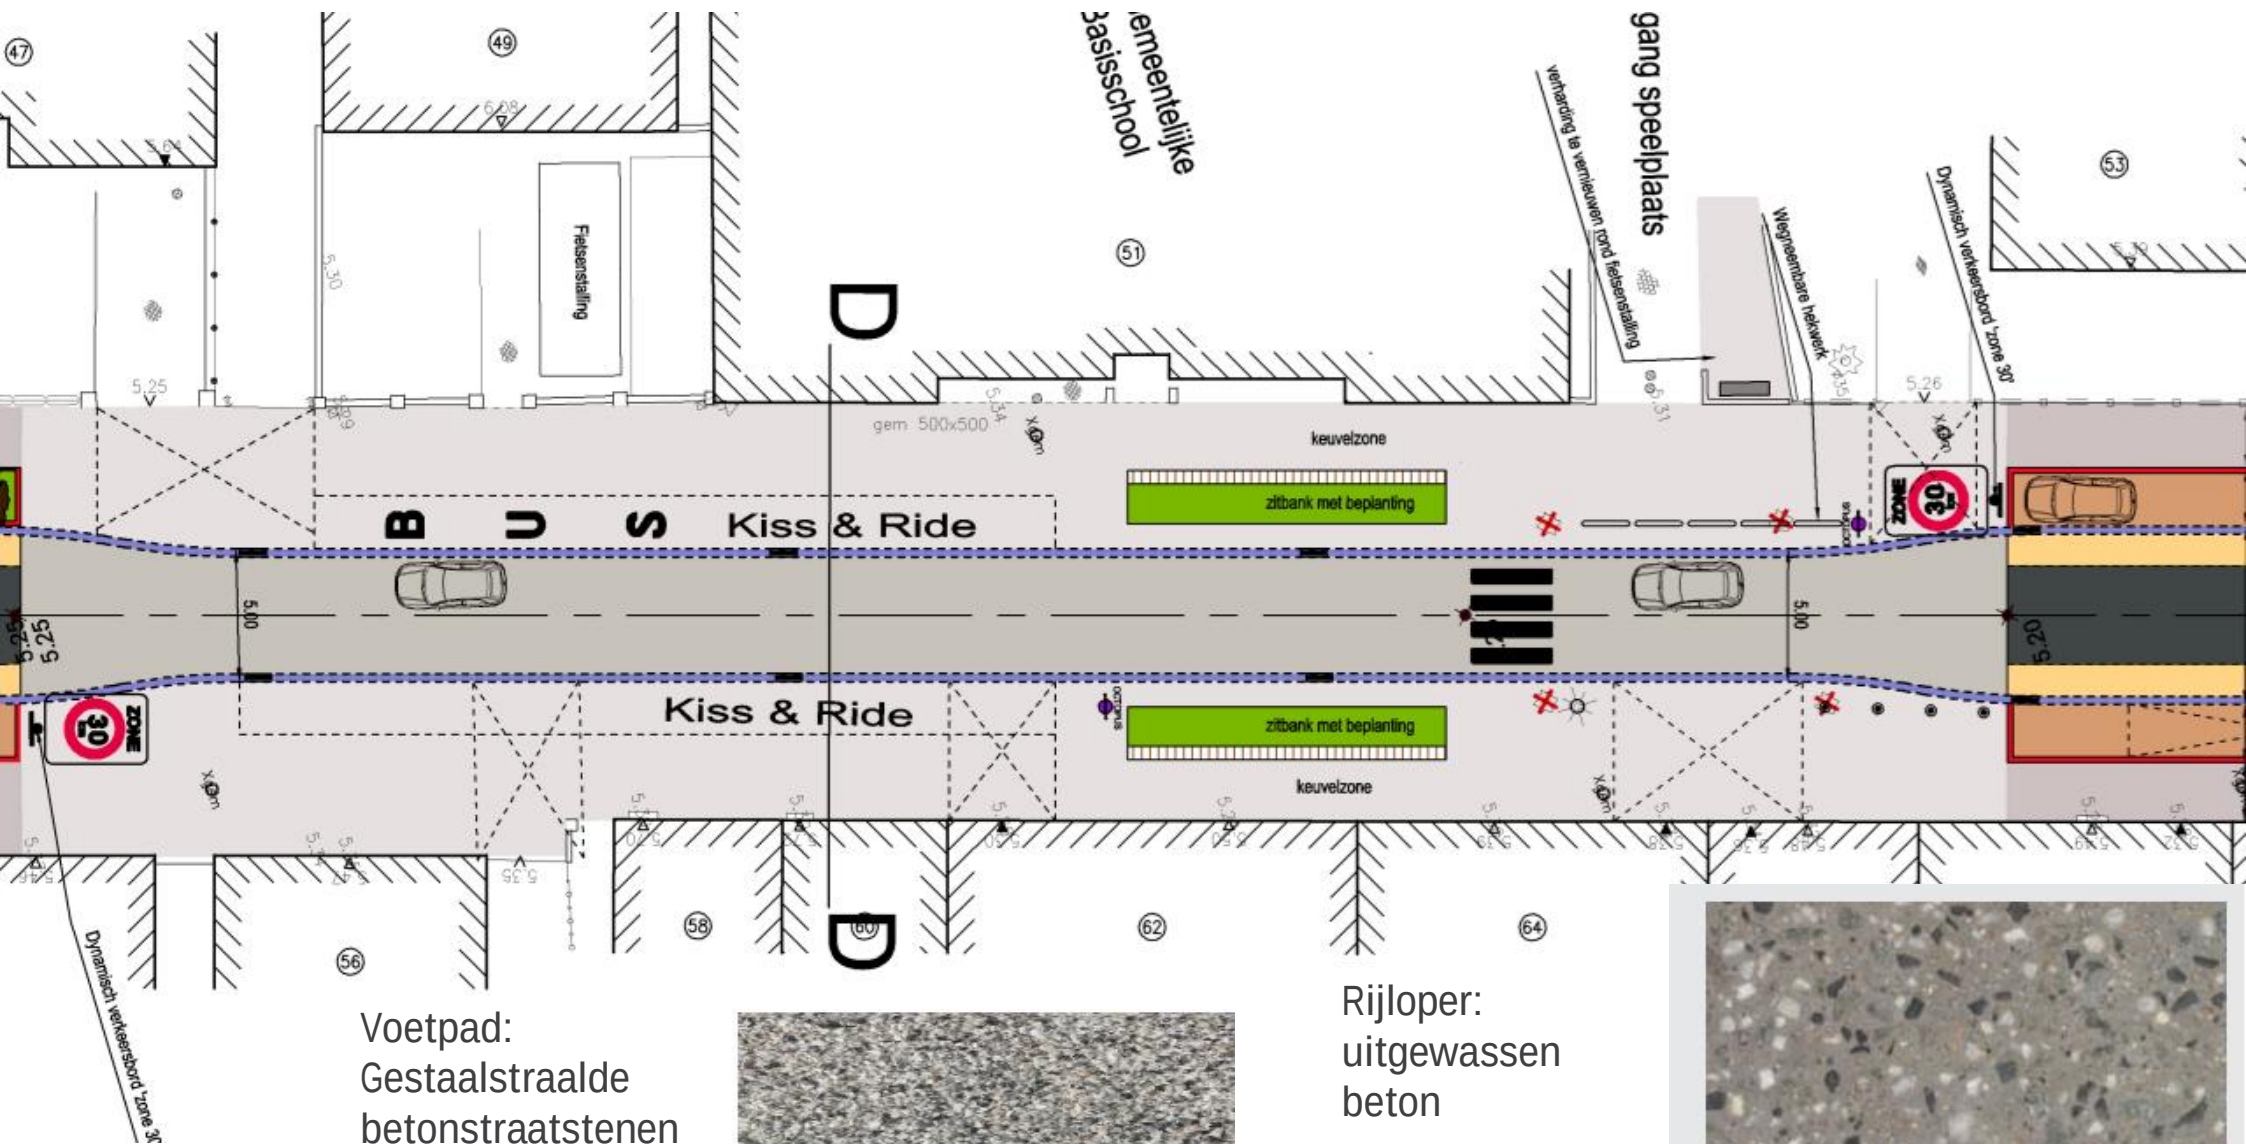


Voetpad:
Gestaastraalde
betonstraatstenen



SAXUM GRANIETGRIJS


Rijloper:
uitgewassen
beton

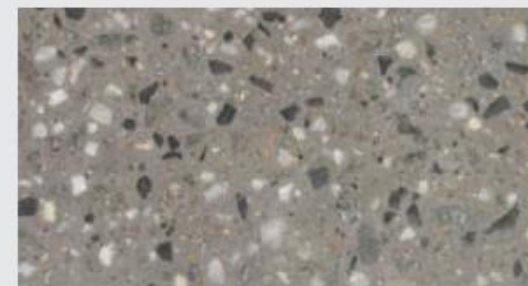

Porfier en wit+zwart



Wegenis: Keiendorpstraat – Tramstation

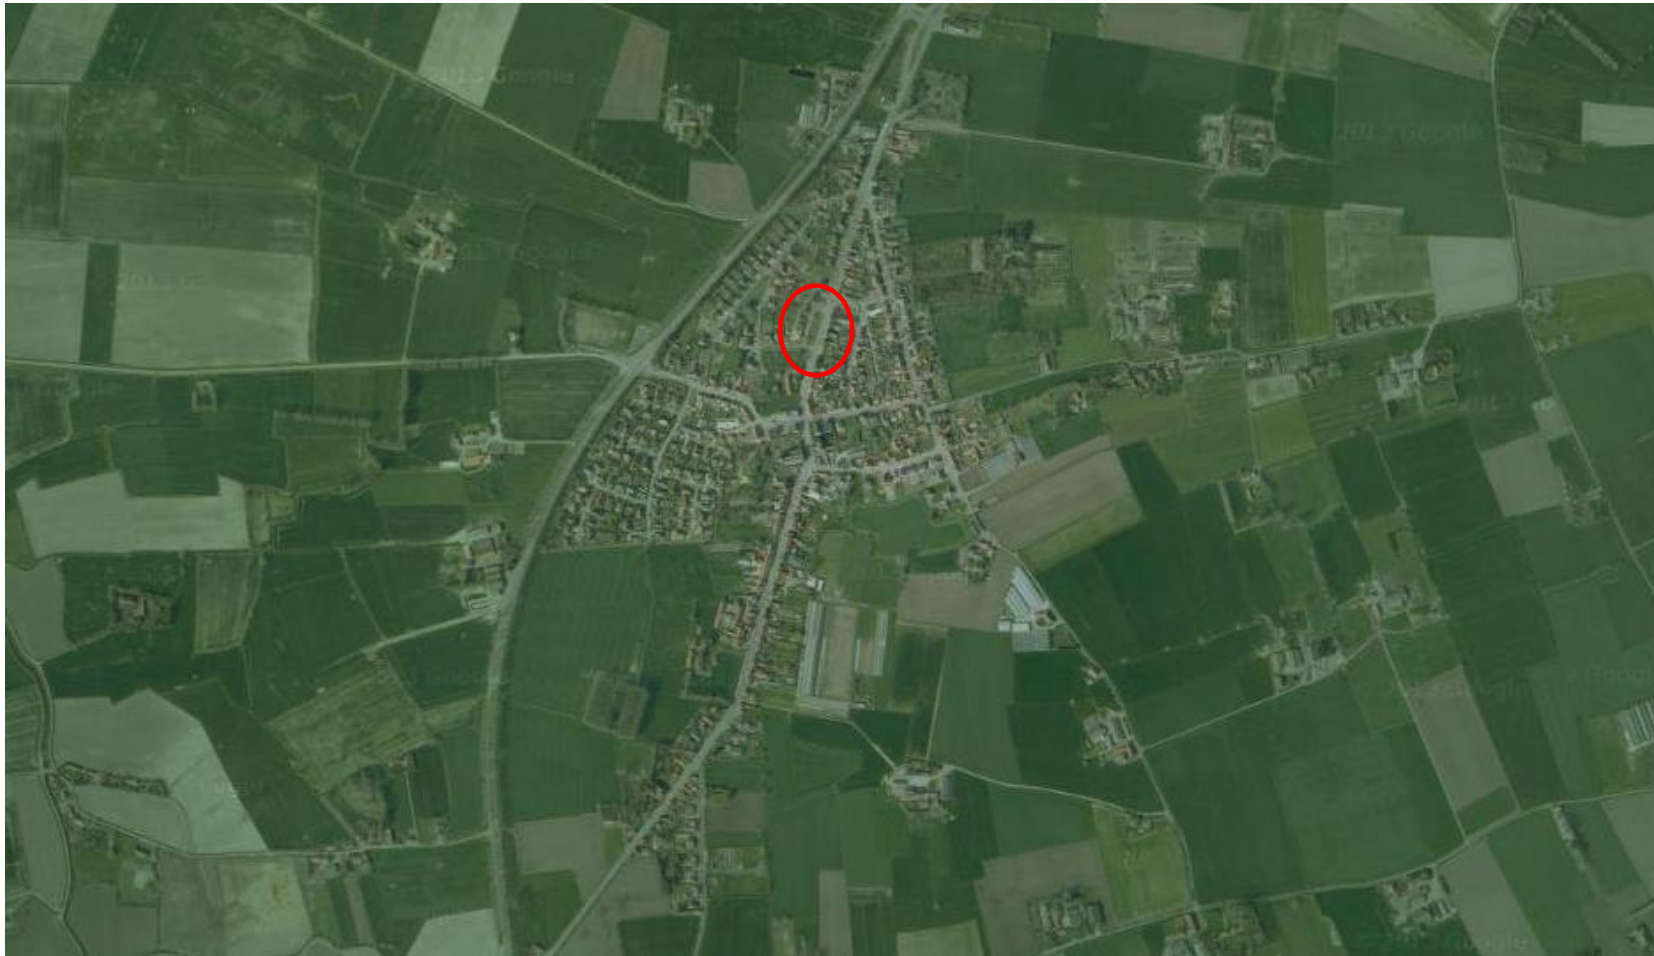

Wegenis: Keiendorpstraat – Tramstation

Naar aanleiding van opmerkingen van de kwaliteitskamer zijn er tov. laatste voorstelling wijzigingen.

- Multifunctionele ruimte
- Bushalte richting kerk
- Rust en ontmoetingsplek
- Groen
- Toegang tot woningen



Wegenis: Keiendorpstraat – Tramstation



Wegenis: Keiendorpstraat – Tramstation



Voetpad:
Gestaalstraalde
betonstraatsten
-en



SAXUM GRANIETGRIJS

Rijloper:
uitgewassen
beton



Porfier en wit+zwart


Planning en fasering

– THV Debrabandere / Vanlerberge: randvoorwaarden

- Uitvoeringstermijn 280 werkdagen
- KP Tervaetestraat bindende deeltermijn van 18 dagen + uitharding beton (10d).
- Schoolomgeving: voorkeur vakantieperiode, toegang via N of Z mogelijk
- Doorgang Oostendestraat – Ramboutstraat -> 7 d , dan via werfweg plaatselijk verkeer mogelijk.
- Na aanleg riolering voorlopige steenslag aan te leggen.

Planning en fasering

- onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weerverlet
- uit te voeren in 7 fasen
- bedoeling om steeds in 2 fasen te werken die geen invloed hebben op elkaar

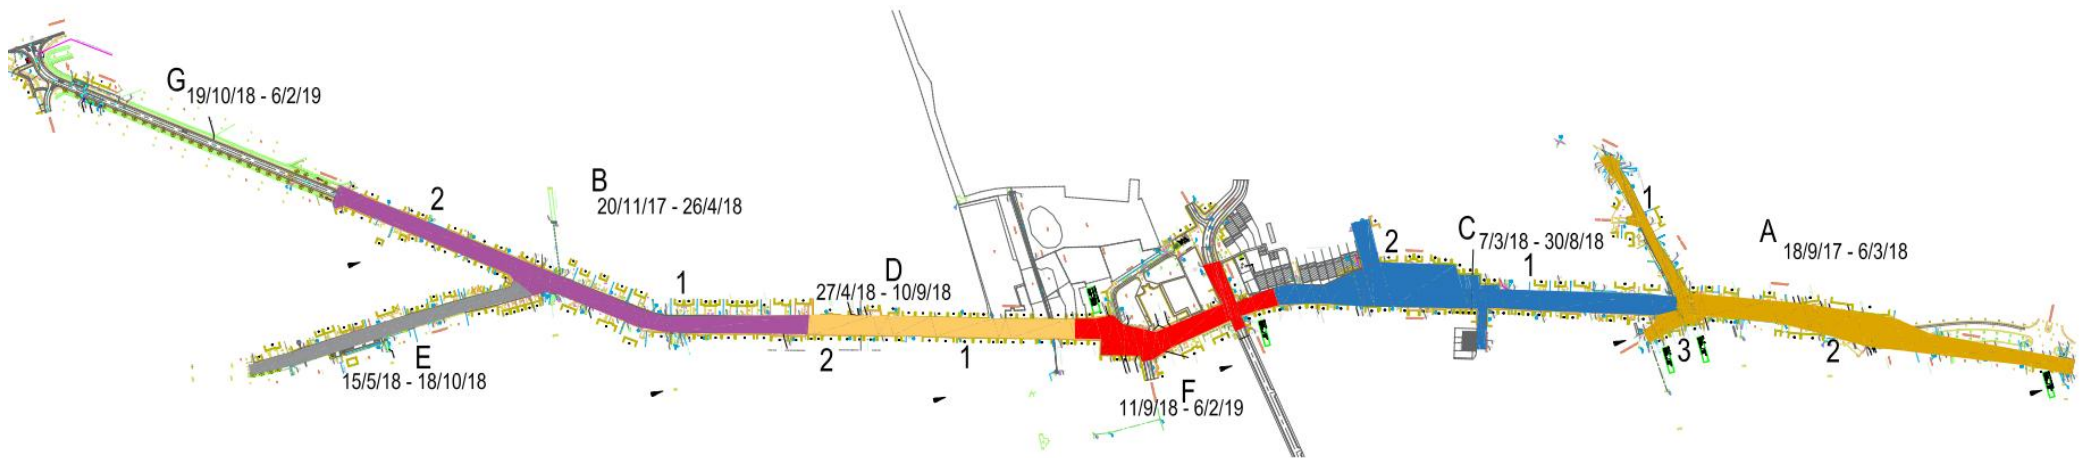


Planning en fasering

- Fase A : 18/09/17 tot 6/03/18
- Na aanleg riolering in deelvak -> start afwerking bovenbouw
- Tijdens rioleringswerken meest hinder.
- Bij het maken van de huisaansluitingen aan uw woning -> geen toegang mogelijk



Planning en fasering


– Fase B : 20/11/17 tot 26/04/18

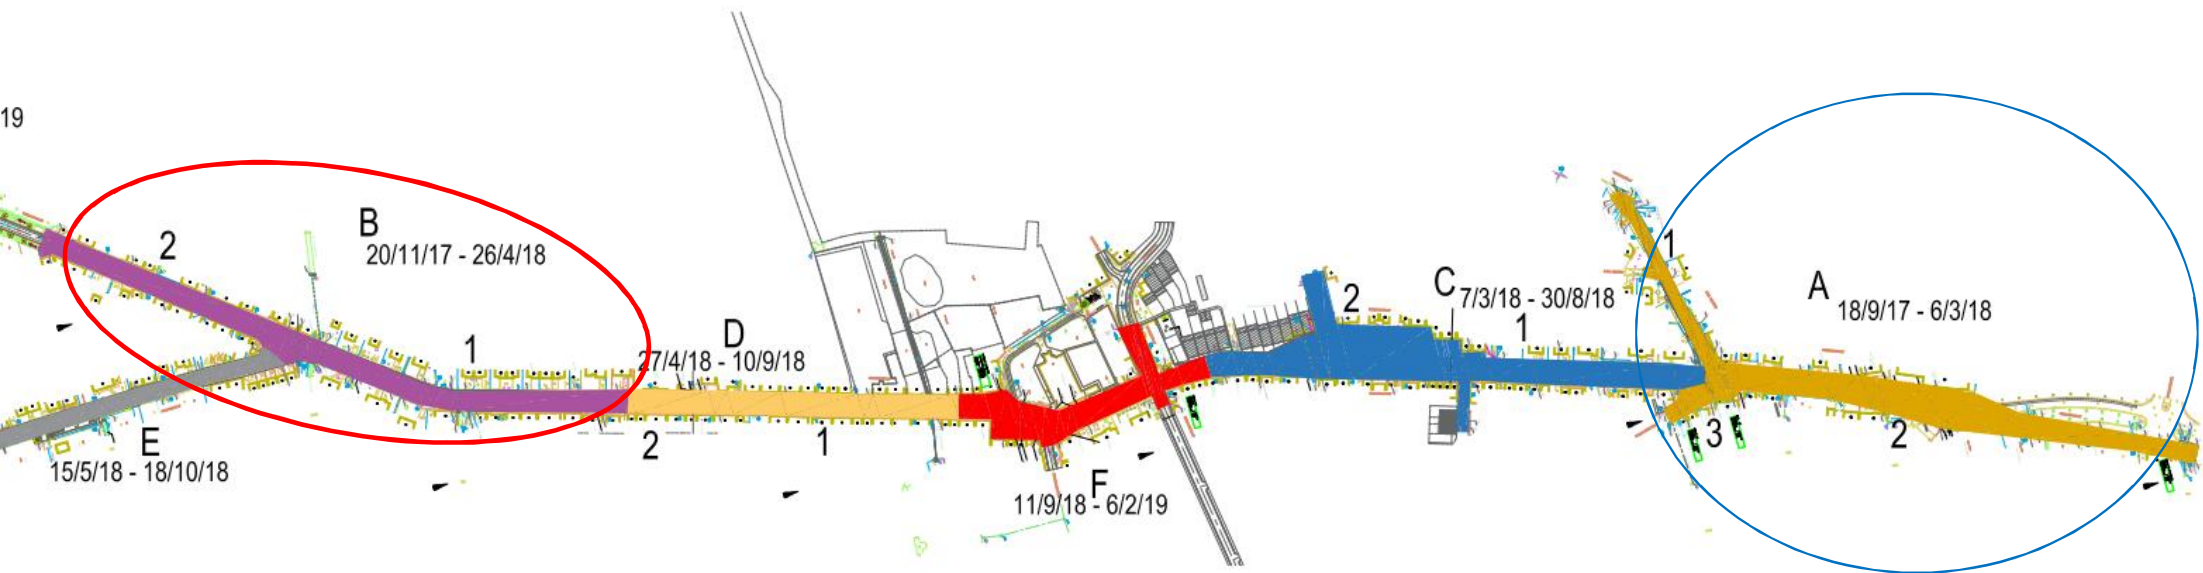

Planning en fasering

– Fase C : 7/03/18 tot 30/08/18

—

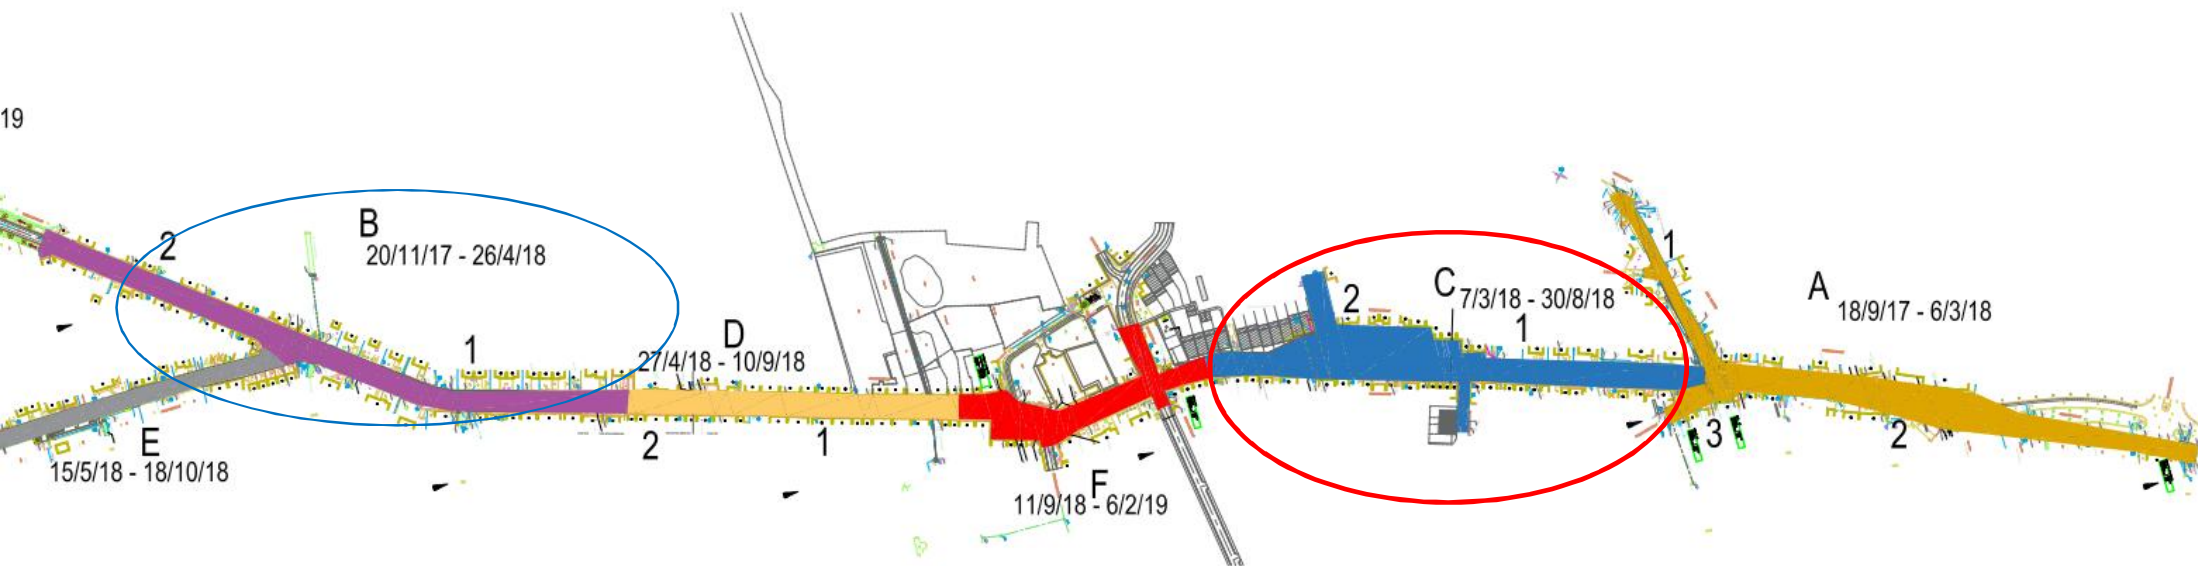


Planning en fasering

– Fase D : 27/04/18 tot 10/09/18




Planning en fasering

– Fase E : 15/05/18 tot 18/10/18

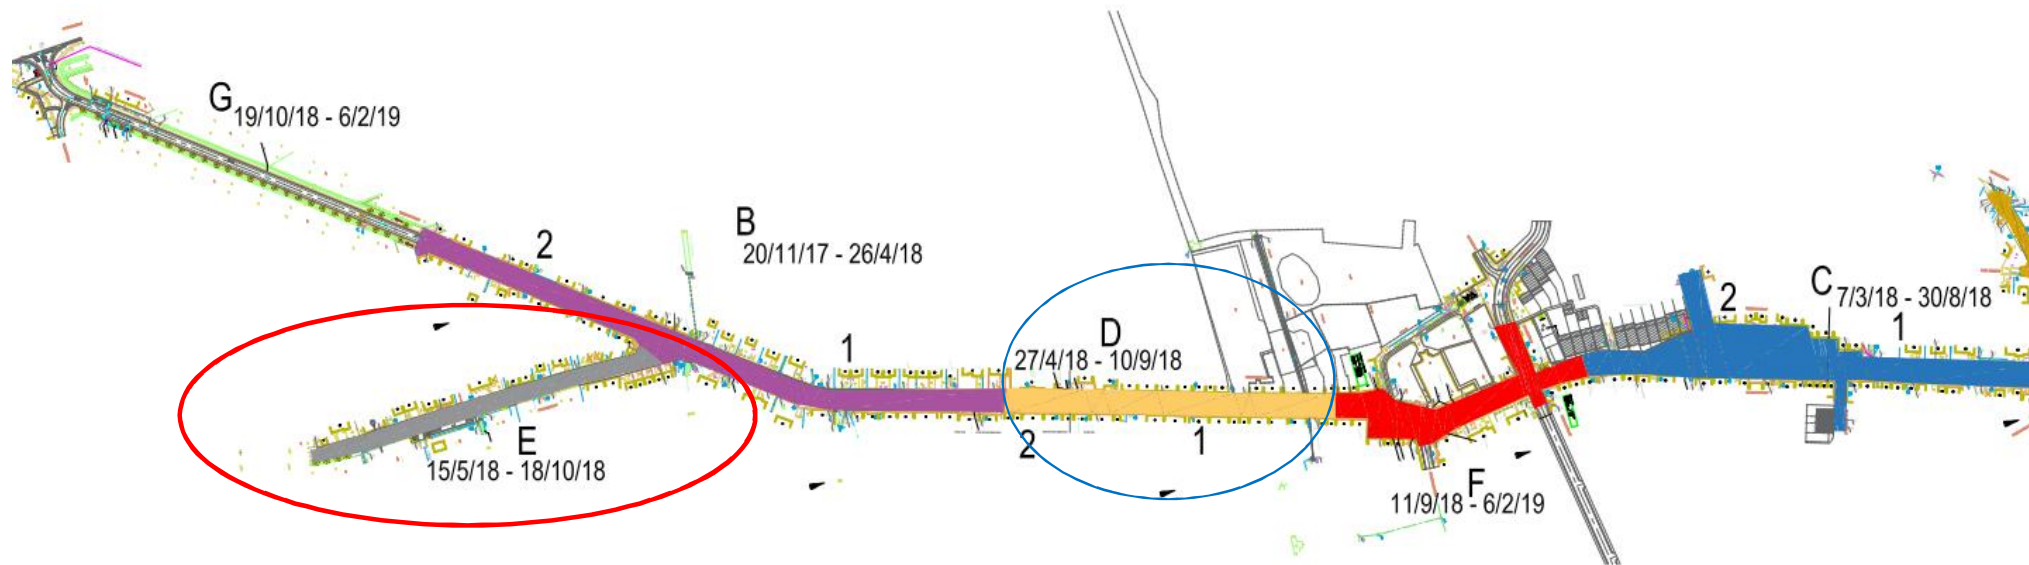


Planning en fasering

– Fase F : 11/09/18 tot 6/02/19

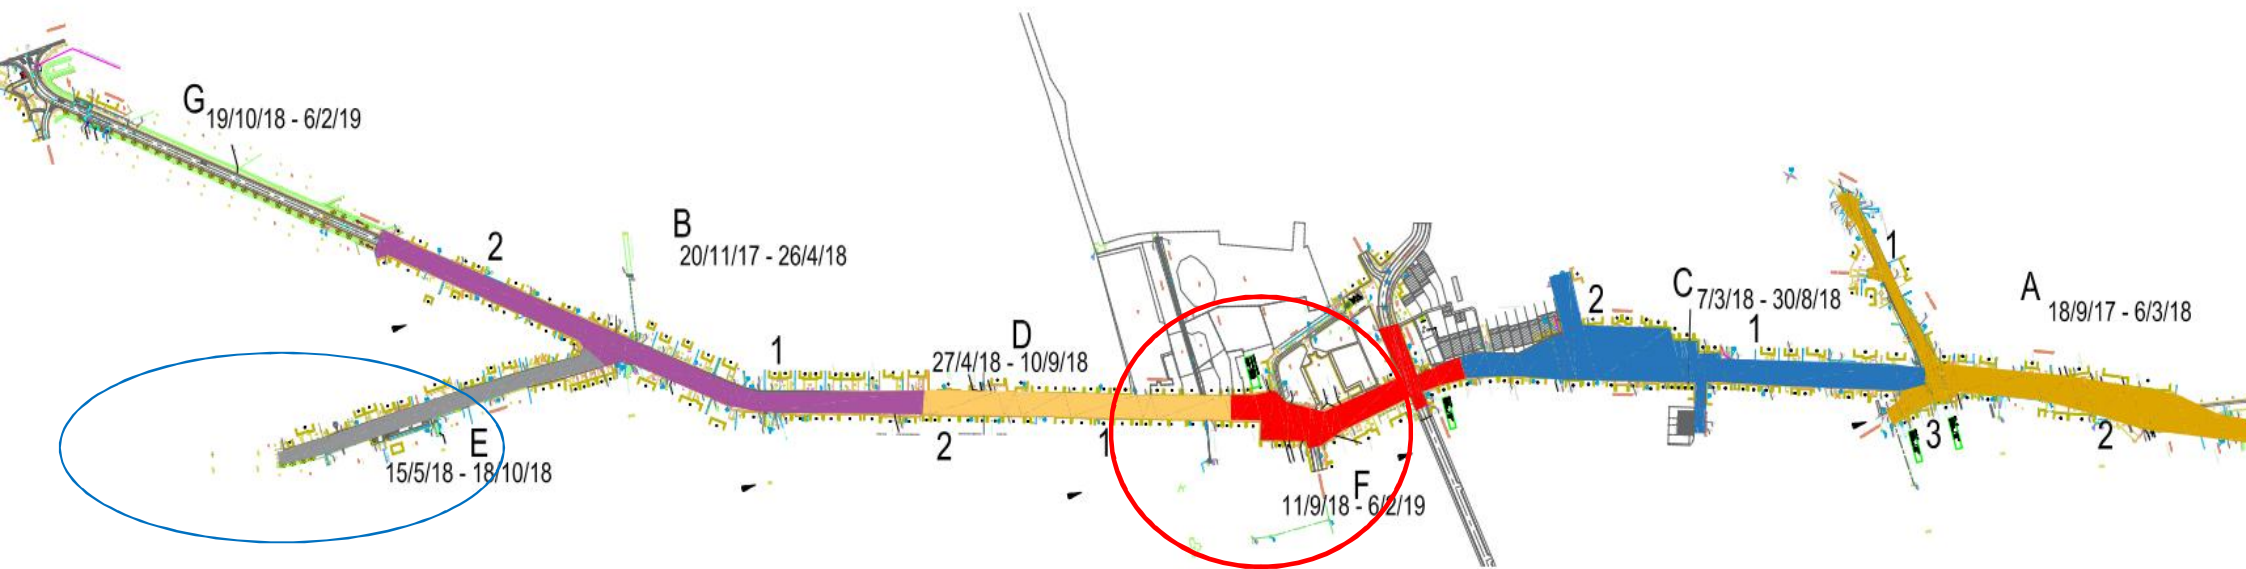

Planning en fasering

– Fase G : 20/11/17 tot 26/04/18

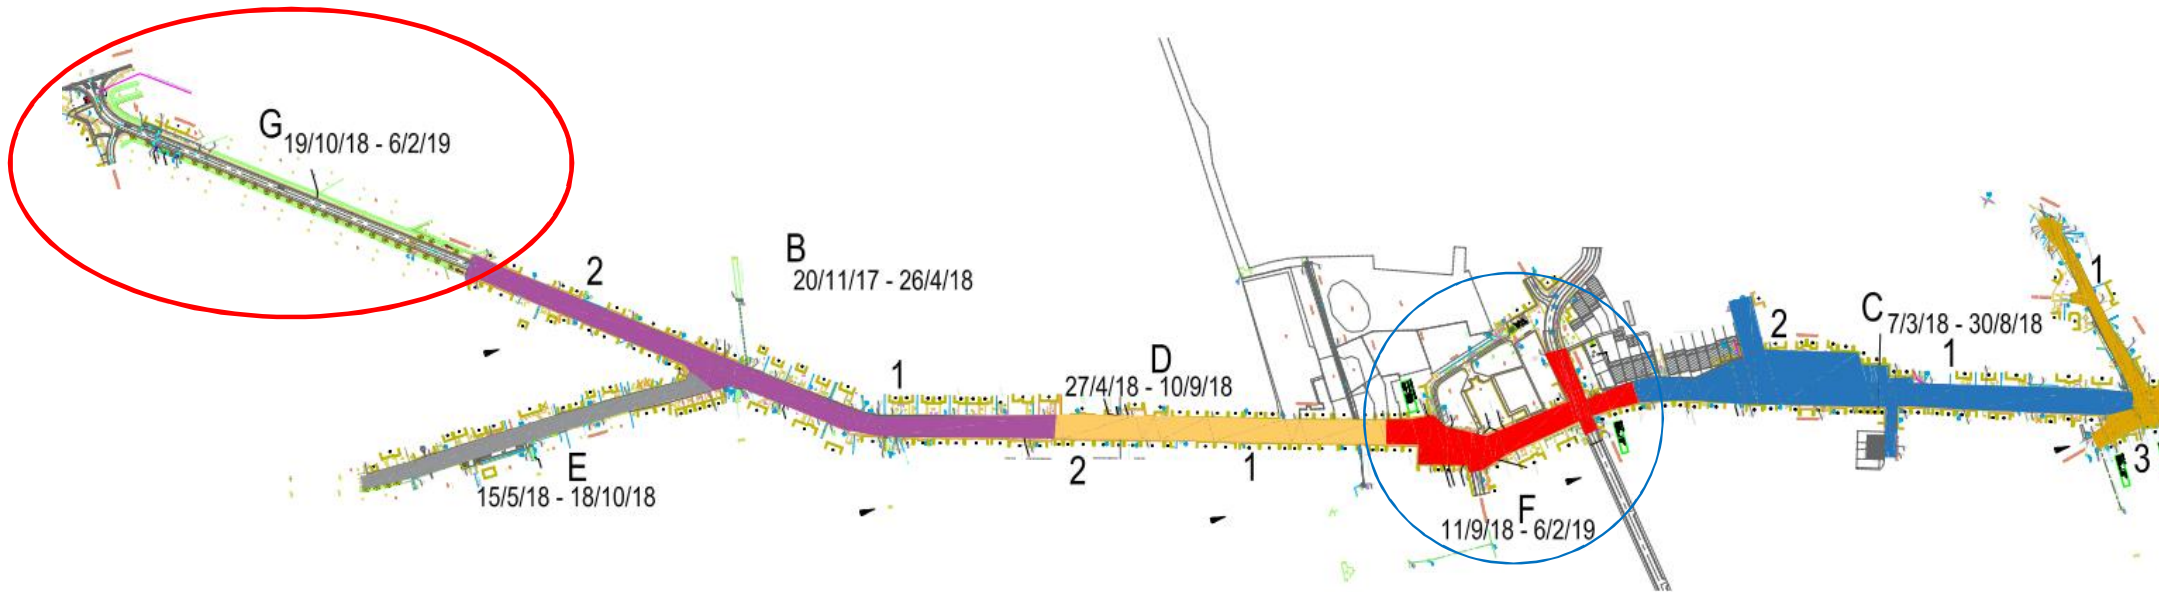

Planning en Fasering – Werkwijze – minder hinder

- Start 18 september 2017
- Opbraak volledige bovenbouw
 - Aanleg minder hinder steenslag pad thv. gevels -> toegankelijk te voet
 - Aanpassingswerken nutsleidingen
- Aanleg hoofdriolering
 - weg toegankelijk voor hulpdiensten
 - uitzonderlijke leveringen zo veel mogelijk buiten werkuren en in overleg met aanneming
- Aanleg huisaansluitingen
 - Woning zeer moeilijk toegankelijk
 - Aanleg onderfundering thv. de weg
- Stelselmatige aanleg bovenbouw
 - Aanneming werd uitdrukkelijk gevraagd om voldoende capaciteit te voorzien
 - Breed profiel waardoor heraanleg met verschillende ploegen mogelijk is
 - Aanleg mager beton in de voetpadzone
- Einde volledige zone : voorjaar 2019

Planning en Fasering : Minder Hinder

- De fase in uitvoering is steeds aan beide kanten ontsluitbaar.
- Bushaltes worden tijdelijk verplaatst.
- Update via website Diksmuide.
- Putten afdichten en duidelijke signalisatie.
- Communicatie



Zoeken...

Media-album • Stadsplan

Actueel

Bestuur

Wonen

Werken

Welzijn

Vrije tijd

A tot Z

Home > Actueel >

Werkzaamheden

Alle werken

Huidige projecten



Fiets- en wandelverbinding
IJzerdijk
Kaaskerke



Fietspad langs N35 - N 364
Oudekapelle



Masterplan sport
Centrum



Ga naar

Huidige projecten

Geplande projecten

Afgeronde projecten

Deelgemeenten

Centrum

Esen

Kaaskerke

Keiem

Oostkerke

Algemeen : Kostprijs der werken

- Aandeel Diksmuide: 2,7 milj. €
- Aandeel Infrax: 3,0 milj. € (incl. aandeel subsidieerbaar VMM)

VRAGEN ?

